

NTNU – Samlokaliseringsprosjektet - fusjon

Status mai 2018

LOSAM BU 15. mai 2018



Status og videre fremdrift

- Styringsgruppa har vurdert status og videre fremdrift i lys av:
 - felles mål og suksesskriterier for faglig integrasjon
 - langsiktig campusutvikling, faglig lokalisering og fysisk plan
 - sammenheng mellom Samlokaliseringsprosjektet og Campusprosjektet
 - behov for gode organisasjonsprosesser og medvirkning

Felles mål og suksesskriterier

Overordnet målsetting: Faglig integrasjon

Suksesskriterier:

- **Realisering av synergipotensialet i fusjonen**
- Opplevd gode og hensiktsmessige arbeidsplasser- /miljø for ansatte
- Opplevd gode og hensiktsmessige læringsarealer- /studentmiljø
- Opplevd god og åpen medvirkning i hele prosessen
- Økt arealeffektivitet og bedre utnyttelse av laboratoriekapasitet

Usikkerhetsmomenter rammebetingelser

- risiko og muligheter

- Avklaringer for fysisk plan og faglig lokalisering er utsatt
 - risiko for at det gjøres feilaktige investeringer
 - mulighet til å se samlokalisering i et langsiktig perspektiv
- Planlagt ombygging av 45.000 kvm på Gløshaugen som del av Campusprosjektet
 - risiko for at samlokaliseringsprosjektets ombygginger berører aktuelle arealer
 - mulighet til å se faglig integrasjon i lys av campusprosjektets planer
- Fremtidig konsept for læringsarealer/identitetsarealer må avklares
 - risiko for at det gjøres feilaktige investeringer før konseptvalg er avklart
 - muligheter for å få til mer helhetlige løsninger og bedre læringsmiljø
- Løsningene er ikke gode nok til å realisere målene med samlokaliseringen
 - risiko for at gevinsten av de faglig integrasjoner ikke realiseres godt nok
 - risiko for at det læringsmiljø og arbeidsmiljø oppleves mindre hensiktsmessig enn før
 - mulighet til å øke omfang og kvalitet for å få bedre faglig integrasjon

Overordnet status fremdrift

Prosjekter i gjennomføringsfase:

- Flytting av elektromiljøene, allmenn og fornybar energi på Gløshaugen i rute for flytting høst 2018
- Samling av lærerutdanningen på Kalvskinnet i rute til desember 2018, men stram tidsplan
- Flytting av sosialøkonomi til Rustbygget i rute til desember 2018(?)
- Flytting av Maskin og logistikk til Gløshaugen i rute til desember 2018

Prosjekter i planleggingsfase:

- Øvrige flyttinger kan gjennomføres innen 2020 (forutsatt økonomisk ramme)

Det antas at disse flyttingene kan forskyves uten at det skaper kapasitetsproblemer på Kalvskinnet på kort sikt

Prosjektoversikt – status fremdrift

- **Prosjekter under gjennomføring - ferdig august 2018**

Fra Kalvskinnet til Gløshaugen:

- IV - fornybar energi til Varmeteknisk
- IE - IDI undervisning/studentareal til Realfagbygget A-blokka
- IE – Elektrolabber og Allmenn forkurs til Høgskoleringen 3
- IE - Elektroniske systemer, Elkraft, Tekn. kyb til Elektroblokkene

Fra Gløshaugen til Kalvskinnet:

- Fellesadm - Digital eksamen til Sukkerhuset

- **Prosjekter under planlegging/prosjektering**

Fra Kalvskinnet/Dragvoll til Gløshaugen:

- IV - Maskin og logistikk til Verkstedteknisk (ferdig desember 2018)
- ØK - Samfunnsøkonomi til Rustbygget (ferdig desember 2018?)
- IV - Geologi og berg til Valgrinda (nybygg)
- IV - Bygg og miljø til Bygningsteknisk

Fra Moholt/Dragvoll/Gløshaugen til Kalvskinnet:

- SU – Lærerutdanningen fra Moholt til Gunnerus gt. 1 (ferdig desember 2018)
- Fellesadm - Øk.avd, IT-avd, Avd for studieadm., Avd for dok.forvaltning, HR-HMS-avd

- **Prosjekter ikke startet planlegging/prosjektering**


Fra Kalvskinnet til Gløshaugen

- IV - Program for Industriell økologi (IndEcol) til Oppredningen
- NV – Materialteknologi til Oppredningen
- Felleslab IE, IV og NV til Oppredningen
- IE - Datateknikk og informatikk til IT-bygg
- NV – Matvitenskap til Realfagbygget (utredes)

Konkrete tiltak

- **Fullføre fase 1:**
 - Gjennomføre pågående flyttinger av teknologimiljø fra Kalvskinnet til Gløshaugen høsten 2018
 - Samling av Lærerutdanningen på Kalvskinnet (flytting fra Moholt) desember 2018
 - Flytting av Sosialøkonomi til Rustbygget (flytting fra Dragvoll) desember 2018
 - Flytting av Maskin og logistikk til Verkstedsteknisk desember 2018
- **Vurdere framdrift og se på konsekvenser av utsettelse inntil 1 år, herunder vurdere:**
 - kapasitet undervisning Kalvskinnet
 - ulemper undervisning ved flere campus
 - behov for naturfaglaboratorier for ILU
 - konsekvenser for de som evt. får utsatt flytting
 - organisasjonsmessig belastning – usikkerhet for berørte miljøer

Samlokalisering etter fusjon
 – nye lokasjoner 2018-2020:
 (grønne under gjennomføring)
 (røde vurderes utsatt)

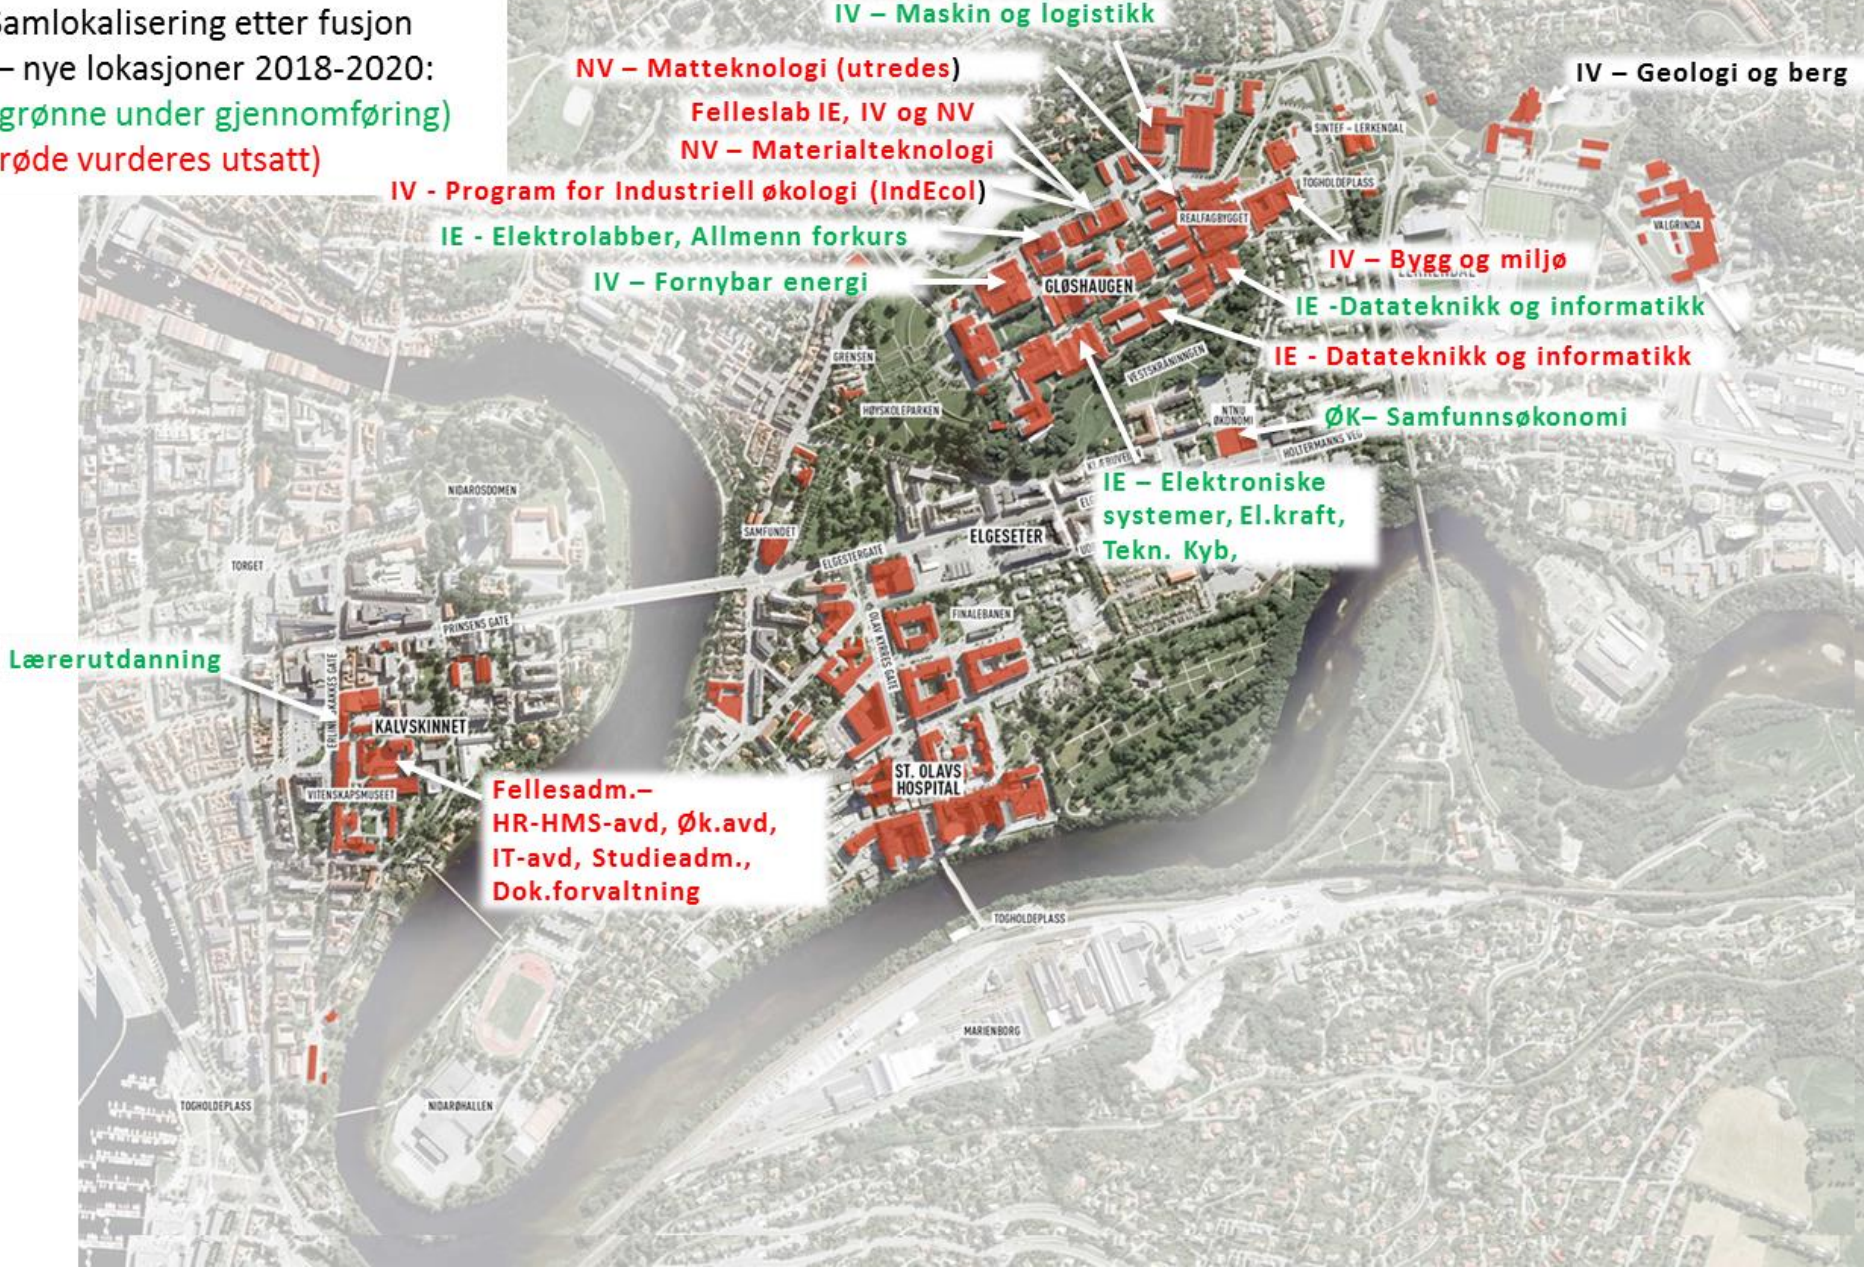

Evt. konsekvenser fellesadministrasjonen

- IT-avdelingen kan bli sittende lengre i Sluppenveien
- Økonomiavdelingen kan bli sittende lengere på Moholt
- Avd. for dokumentasjonsforvaltning kan bli sittende lengre på Dragvoll
- Avd. for Studieadministrasjon kan bli sittende lengre på Gløshaugen
- Kan ta lengre tid før HR-HMS-avd kan få økte areal i fht til sin vekst

Videre plan

- redusere usikkerhet omfang, løsning og kostnad

Beslutning 1 – Ramme for videre arbeid resterende prosjekter (juni/aug)

- plassere funksjoner i bygg, etasje og rom
- => Arealramme og kostnadsspenn pr. prosjekt

Beslutning 2 – Avklare rammebetingelser omfang, kvalitet og kostnadsramme for resterende prosjekter (des/jan)

- tilpasning til faglig lokalisering og fysisk plan
- tilpasning til konseptvalg
- ivaretagelse av målbilde
- => Ramme for oppstart forprosjektering

Beslutning 3 – Utarbeide forprosjekt basert på kostnadsramme og rammebetingelser kvalitet og omfang (vår 2019)

- utarbeide løsning klar for detaljprosjektering/anbud
- kvalitetssikret kostandskalkyle
- => Ramme for detaljprosjektering

Beslutning 4 – Beslutte gjennomføring av resterende prosjekter (vår 2019)

- => Oppstarts beslutning detaljprosjektering

Videre prosess for vurdering av fremdrift

- LOSAM fakultet/FA
- AMU 25.4
- SESAM (4.5)
- Dekanmøte (8.5)
- Styringsgruppa (16.5)
- Rektorvedtak (mai)
- Styrebehandling (aug)
