


Samlokalisering etter fusjon

Status – ultimo september 2018

LOSAM BU

20. sept 2018



Tema


- Status Samlokaliseringsprosjekt – ultimo sept 2018
- Status Fellesadministrasjon til Kalvskinnet
- Eventuelt

Felles mål og suksesskriterier

Overordnet mål: Faglig integrasjon

Suksesskriterier:

- **Realisering av synergipotensialet i fusjonen**
- Opplevd gode og hensiktsmessige arbeidsplasser- /miljø for ansatte
- Opplevd gode og hensiktsmessige læringsarealer- /studentmiljø
- Opplevd god og åpen medvirkning i hele prosessen
- Økt arealeffektivitet og bedre utnyttelse av laboratoriekapasitet

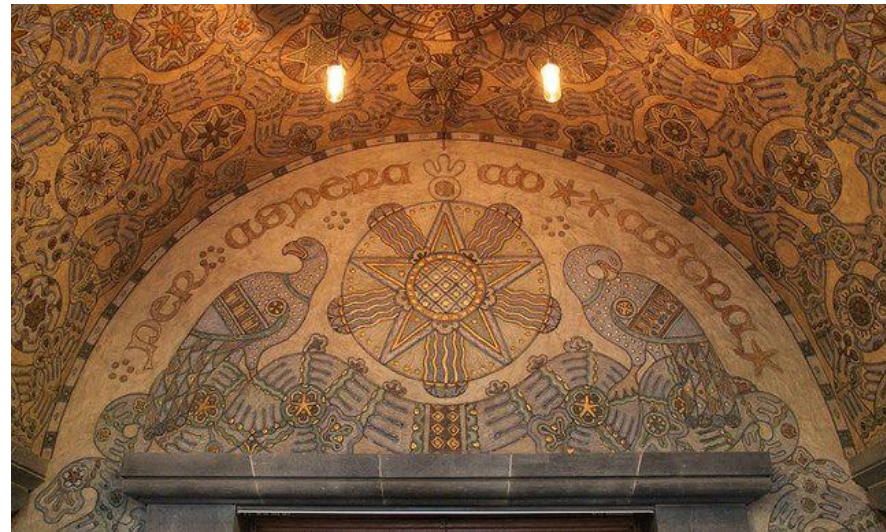

Status gjennomføring

- De første teknologimiljøene er flyttet til Gløshaugen. Andre pulje i rute for flytting desember 2018
- Lærerutdanningen fortsatt i rute for flytting desember 2018 – inkl naturfagsarealer i Lysholmbygget
- Avd. for studieadministrasjon midlertidig til Moholt
- Samfunnsøkonomi til Handelshøyskolen ila. vinteren 2019
- Nybygg Valgrinda i rute – tas i bruk semesterstart høst 2019
- Fellesadministrasjon til Kalvskinnet – forberedelser igangsatt
- Kvalitetssikre at det er tilstrekkelig læringsarealer Gløshaugen/Kalvskinnet



Gjenstående flyttinger

IV-fak:

- Bygg og miljø til Gløshaugen
- Indecol (flytter internt på Gløshaugen)

IE-fak

- Informatikk og datavitenskap til Gløshaugen

NV-fak

- Materialteknologi til Gløshaugen (+ evt felleslab)
- Matvitenskap til Gløshaugen (utredes)

Fellesadministrasjon

- Studieadm., Øk-avd, Dok.forv, IT til Kalvskinnet (+ HR- og HMS-avd. evt internt Kalvskinnet)

Videre fremdrift – høst 2018

- Avklare endelig omfang av resterende flyttinger
 - basert på konsekvenser av fysisk plan, faglig lokalisering og samlet kostnadsprognose
- Avklare konsekvenser av aktivitetsvekst
 - IE/IDI - Gløshaugen
 - ILU - Kalvskinnet
 - NV-fak - Realfagsbygget
 - Fellesadm. (IT, ØK, HR/HMS, studieadm) – Kalvskinnet
- Piloter – campusutvikling/arealkonsepter og innovative læringsarealer
