



NTNU

Kunnskap for en bedre verden

Samlokalisering etter fusjon

LOSAM 2.11.2017

Tema:

- Forslag til rektors vedtak
- Revidert fremdriftsplan
- Oppdatert risikobilde
- Videre prosjektorganisasjon

Hele ILU til Kalvskinnet årsskiftet 2018/2019

Forutsetninger:

- Matematikksenteret og Skolelaboratoriet ut av R-A4 tidlig 2018
- Inst. for elektroniske systemer, elkraftteknikk, teknisk kybernetikk lokalisert i Elektroblokkene D/F, samt i Høgskoleringen 3 innen 1.8.2018
- Fornybar energi lokalisert i Varmeteknisk innen 1.8.2018
- Inst. for Allmennfag lokalisert dels på Kalvskinnet (forkurs), dels på Gløshaugen innen 1.8.2018
- Undervisning IE lokalisert i Realfagbygget A4 innen 1.8.2018
- ILU Moholt lokaliseres på Kalvskinnet årsskiftet 2018/2019

Teknologi til Gløshaugen innen januar 2020

- Inst. for datateknikk og informatikk og Inst. for materialteknologi fortsetter med dagens lokalisering på Kalvskinnets til flyttingene til Valgrinda og Oppredningen er gjennomført, dvs årsskiftet 2019/2020
- Byggearbeider i A blokk Realfagbygget (A3 og A4) starter tidlig 2018
- Renate-senteret lokaliseres på Gløsa i IEs arealer, midl. utenfor R-A4 fra tidlig 2018
- Inst for bygg og miljø fortsetter med dagens lokalisering i Arkitekt Christies gt. 2 til årsskiftet 2018/2019
- Mat-teknologi fortsetter med dagens lokalisering i Akkrinn til årsskiftet 2018/2019
- Inst for maskinteknikk og produksjon fortsetter med dagens lokalisering i Sverres gt. 10 (evt. i avlastningsarealer) til årsskiftet 2018/2019
- Studentarealer til Innovasjonssenteret Gløshaugen lokaliseres i nye lokaler utenfor Verkstedteknisk tidlig 2018

Behov for midlertidige flyttinger


- A-blokka i Realfagbygget, 2, 3 og 4 etasje må tømmes pga av byggearbeider, samt innflytting av nye miljøer fra høsten 2018.
 - Medfører at IT-avdelingen må flytte ut innen mars 2018
 - Midlertidig lokalisering er under avklaring
- E-blokka i Realfagbygget, 4 etasje må tømmes pga av byggearbeider fra høsten 2018.
 - Avd for Studieadministrasjon og Multimedialab må flytte ut innen 1. august 2018.
 - Midlertidig lokalisering i Hovedbygget på Gløshaugen

Styringsgruppa for samlokalisering foreslår at rektor gjør vedtak om:

1. Revidert fremdriftsplan hvor faggruppene innen teknologi flyttes fra Kalvskinnet på ulike tidspunkt for å muliggjøre logistikken som kreves i denne prosessen. Flyttingene vil nå skje i perioden august 2018 til årsskiftet 2019/2020.
2. Deler av ILU lokaliseres fra årsskiftet 2017/2018 i nytt lærerbygg CK2, i Sverres gt 15 og deler av 1. etg. Akrinn.
3. Resten ILU lokaliseres fra årsskiftet 2018/2019 også i 1- 4. etg. i norddel i Gunnerus gt. 1.
4. Skrivesenteret og Matematikksenteret, evt også Skolelaboratoriet lokaliseres på Kalvskinnet fra årsskiftet 2017/2018 innenfor ILUs arealer.
5. Det skal etableres erstatningsarealer for eksisterende undervisningsareal/dansesal på Moholt som del av videre arbeid, evt i sambruk med andre miljøer.
6. Det forutsettes et samarbeid mellom fakultetene om bruk av naturfaglaboratoriene i Akrinn fra 2018
7. Avd. for studieadministrasjon, Avd. for dokumentasjonsforvaltning, Økonomiavdelingen og IT-avdelingen lokaliseres på Kalvskinnet.
8. Avdeling for studieadministrasjon og deler av IT-avdelingen får midlertidig lokalisering fra tidlig 2018 for at flyttekabalene skal gå opp.

Samlokalisering etter fusjon

- sentrale aktiviteter

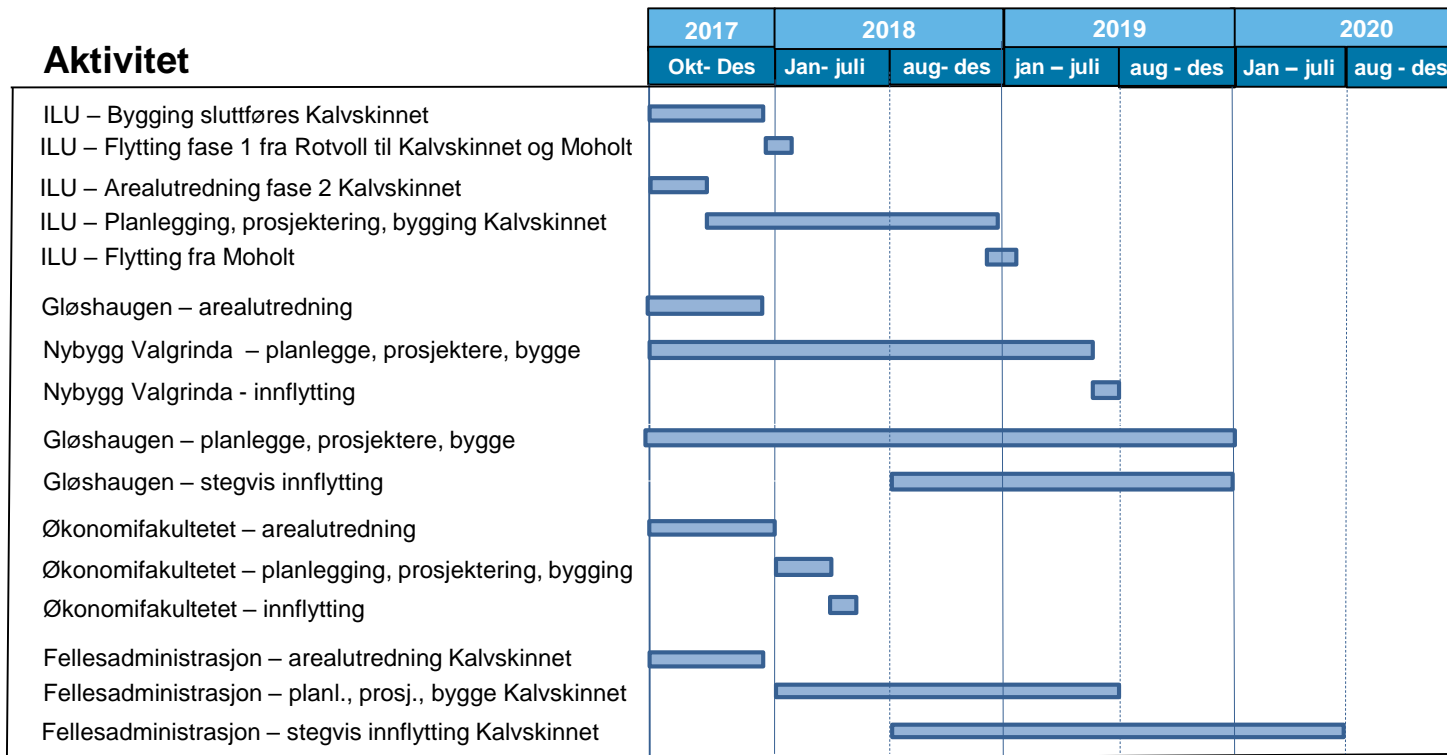


Samlokalisering etter fusjon

- overordnet risikobilde okt 2017 (vs juni 2017)

Sannsynlighet ->

- 1. Manglende avklaringer/beslutninger
- 2. Kvalitet ILU
- 3. Fremdrift ILU
- 4. Kvalitet Gløshaugen
- 5. Fremdrift Gløshaugen
- 6. Økonomi
- 7. Medvirkning/forankring

Konsekvens ->

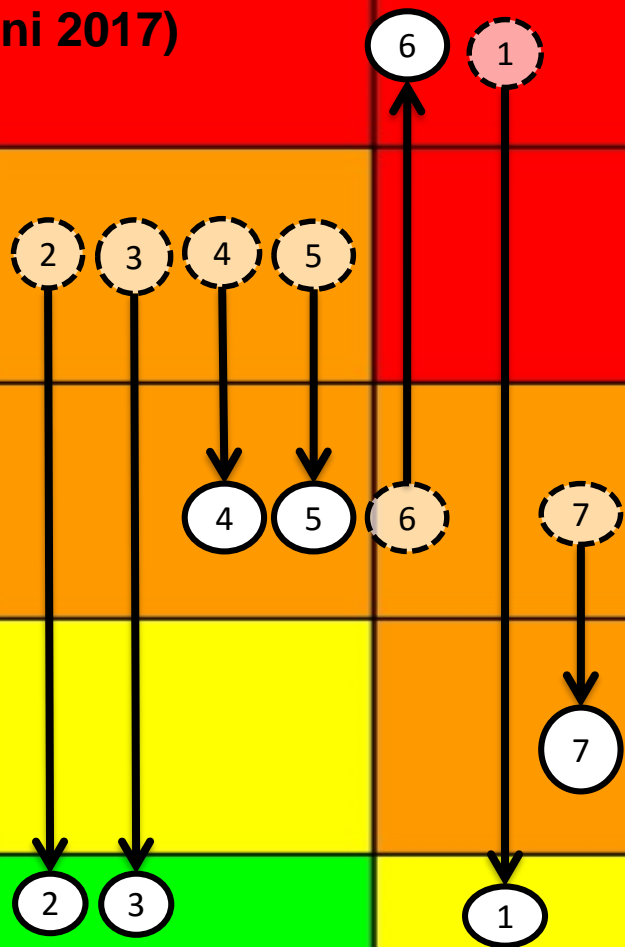

Samlokaliseringsprosjekt fom 1.1.2018 (operativ fra 1.12.2017) prosjektorganisering – foreløpig strukturskisse

